

Format voortgangsverslag landschapstafel over het jaar 2020

*Gebiedscoalitie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (incl. Noordelijke Drechtsteden)
Meerjarenprogramma Groen Verbindt*

*Een afspraak tussen ondernemers, onderwijs, overheden en maatschappelijk middenveld in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden om de streek **groener, levendiger, toegankelijker** en **duurzamer te maken***



Algemene informatie

Naam Landschapstafel	Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (inclusief Noordelijke Drechtsteden)
Rapportagejaar	2020
Datum opgesteld	1-3-2021
Beschikkingnummer	PZH-2016-575469611, DOS-2016-0012138
Contact	Arjan van der Wiel, regiobureau A-V, Arjan.v.d.Wiel@gorinchem.nl

Informatie over de organisatie van de landschapstafel

Voorzitter	Roeland Buijsse
Secretaris	Rolia Wiggelinkhuijsen
Penvoerder	Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Deelnemende partijen aan de landschapstafel	<u>Bestuur gebiedscoalitie A-V</u> Roeland Buijsse, voorzitter Stichting Blauwzaam, Rolia Wiggelinkhuijsen Wellantcollege (MBO, VMBO), Yvonne Ouwens Gebiedsplatform A-V, Jan Boele Gemeenten regio A-V + Noordelijke Drechtsteden, Maks van Middelkoop Namens de provincie Zuid-Holland, Hester Engelsman Regiobureau A-V, Arjan van der Wiel
Overige partijen	DaVinci College, Den Hâneker, Stichting Groene Hart, Zuivelfabriek de Graafstroom, gemeente Alblasserdam, gemeente Zederik, gemeente Sliedrecht, gemeente Papendrecht, gemeente Vijfheerenlanden, werkgroep prachtlint, waterwerkgroep, Hogeschool Inholland, partijen verenigd in de waterdriehoek, gemeente Molenlanden, Waterschap Rivierenland, Oasen, gemeente Dordrecht, Rijkswaterstaat, Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard, gebiedscoöperatie Alblasserpoort, Paul Blok (Westeinde), Stichting Boerderij en Erf, Stichting Lionsclub Alblasserwaard Souburgh, Stijn Philips, Gebiedscollectief A-V, Stichting Oud-Hollandse waterlinie, OBS J.P. Waale, Gemeente Gorinchem

Wijzigingen in de scope van het gebiedsprogramma

Beschrijf en motiveer hieronder wijzigingen in het gebiedsprogramma, bijvoorbeeld wijzigingen in de doelstellingen of wijzigingen in de ambities van het programma.

Er zijn geen wijzigingen in het programma. Enkele projecten zijn vertraagd ten opzichte van hun eigen oorspronkelijke planning. Het was bijvoorbeeld minder eenvoudig om in 2020 fysieke bijeenkomsten te organiseren. De doelstellingen zijn niet gewijzigd. Wel heeft de gebiedscoalitie in 2020 de ambitie om tot een vijfde gebiedsdeal te komen, omgezet in actie. Hierover verderop meer.

Procesinformatie op programmaniveau

Geef hieronder een beschrijving van de procesvoortgang van het afgelopen jaar op programmaniveau. Denk bijvoorbeeld aan bestuurlijke besluiten en toezeggingen of gemaakte afspraken in de vorm van overeenkomsten, intentieverklaringen et cetera.

Bestuurlijke samenwerking Gebiedscoalitie

Er hebben geen wijzigingen plaatsgehad in de samenstelling van het bestuur van de Gebiedscoalitie. Cor Revet is bij het regiobureau opgevolgd door Arjan van der Wiel.

Gebiedsdeal 4 Groen Verbindt

Het bestuur van de Gebiedscoalitie heeft de volgende activiteiten ondernomen in 2020 ten aanzien van gebiedsdeal 4:

- Beschikking van het volledige projectbudget en zorgen dat alle projecten tot afronding komen.
- Communicatie via onze website. De website bevat nu een volledig naslagwerk van alle projecten.
- Knelpunten bij de uitvoering van een enkel project weggenomen.

Gebiedsdeal 5 Groenblauw Verbindt

Het bestuur van de Gebiedscoalitie heeft zich in 2020 geconcentreerd op het voorbereiden van een vijfde Gebiedsdeal. Ons werk is namelijk niet af na de huidige programmaperiode. Er is voldoende energie in de streek om initiatieven door te ontwikkelen en nieuwe initiatieven op te halen. Het kader voor de coalitie is het Landschapsuitnodigingsdocument (LUD) dat binnen de Regionale Maatschappelijke Agenda van de samenwerkende gemeenten is geschreven.

In tegenstelling tot eerdere gebiedsdeals is er geen sprake van gegarandeerde (programma)financiering vanuit de provincie. De Gebiedscoalitie heeft de werkwijze dan ook omgedraaid. De coalitie heeft drie thema's onderscheiden, 'Biodiversiteit', 'Veen in beweging' en de 'Waarde van het water'. Binnen deze thema's heeft de Gebiedscoalitie bijeenkomsten georganiseerd en de streek gestimuleerd initiatieven en projecten aan te dragen. Dit leidde tot een grote lijst potentiële projecten. De drie gekozen thema's passen uitstekend binnen de bestuurlijke prioriteiten van gemeenten (LUD) en de provincies.

De Gebiedscoalitie wil in het voorjaar 2021 de gebiedsdeal 5 hebben afgerond.

Voortgang penvoerdersovereenkomsten

In 2020 zijn negen van de 34 projecten afgerond en opgeleverd. Deze moeten nog formeel financieel afronden.

Voortgang samenwerking projecten

Gebiedsdeal 4 Groen Verbindt

De kracht van onze landschapstafel, de Gebiedscoalitie A-V ligt in de ontmoeting, het netwerkend leren. In 2020 is dit ingewikkelder geweest. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten en het contact met projecteigenaren heeft uitsluitend via teams en mails plaatsgevonden. De Gebiedscoalitie heeft ten behoeve van gebiedsdeal 4 in 2020 geen kartrekkersbijeenkomst kunnen organiseren.

Gebiedsdeal 5 Groenblauw Verbindt

Wel hebben wij in de periode september-oktober 2020 bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding op gebiedsdeal 5.



Netwerkbijeenkomst biodiversiteit en ondertekening beheerconvenant met vier nieuwe gemeenten (okt 2020)

Wijzigingen in de programmaplanning

Geef hieronder aan wat de belangrijke wijzigingen zijn in de huidige programmaplanning ten opzichte van de aanvankelijke planning van het gebiedsprogramma. Geef daarbij argumentatie waarom projectrealisatie is vertraagd / niet wordt gehaald.

Het project van Graafstroom, **Kaasexperience center** is vertraagd. In 2020 is de vergunning verkregen waardoor gestart kon worden met de herontwikkeling. Deze bleek echter veel duurder uit te vallen. Initiatiefnemer De Graafstroom heeft in 2020 het project opnieuw gecalculeerd en in afgeslankte vorm aanbesteed. Dit heeft geleid tot een werkbaar project waarvan de uitvoering is gestart. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de Gebiedscoalitie, initiatiefnemer Graafstroom en andere subsidiegevers (provincie en gemeenten). De activiteiten die in het kader van de subsidie Groen Verbindt worden uitgevoerd, zijn in het herziene project overleefd gebleven. De doorstart is in 2020 ter hand genomen en de werkzaamheden die voor de subsidie Groen Verbindt worden uitgevoerd zullen in 2022 zijn afgerond. Voor het deel dat vanuit de Leader subsidie wordt betaald, is een verlenging van de projectperiode aangevraagd. Deze is nog in behandeling.

Westeinde Wijngaarden is nog steeds in afwachting van goedkeuring van een bestemmingsplanwijziging. Dit betekent dat een deel van de werkzaamheden nog niet heeft plaatsgevonden (zie voor detail de beschrijving van de projectvoortgang). Dit project duurt langer dan was voorzien. De planning hangt volledig af van het moment waarop de bestemmingsplanwijziging is goedgekeurd dan kunnen de nog uit te voeren werkzaamheden direct worden uitgevoerd en binnen een aantal maanden worden afgerond. Bestemmingsplanwijzigingen blijken echter weerbarstig.

Blauwzaam: Zwammen kweken op reststroom

Stand van zaken project: Het project is vertraagd als gevolg van Corona. Wellant heeft de kweekactiviteiten kunnen voortzetten maar de avonturenboerderij is veelal gesloten geweest en heeft de financiering tijdelijk stopgezet. Als Corona achter de rug is en de boerderij weer open kan, wordt het project voortgezet. De verwachting is dat het project tot in de loop van 2022 loopt.

Boerderij en erf, Vrijkomende agrarische bebouwing

Stand van zaken project: Dit project ligt stil en wacht op een beleidsnota van de gemeente Molenlanden die ook overgenomen moet worden door de gemeente Vijfheerenlanden. Dan kan dit project worden afgemaakt. Boerderij en Erf en het Gebiedsplatform schatten in dat ook in 2022 nog uitvoering plaatsvindt om deze slag naar andere gemeenten te maken. Afronding vindt dan in 2022 plaats.

Er hebben geen majeure wijzigingen plaatsgevonden. De verwachting is dat alle projecten in 2022 zijn afgerond.

Wijzigingen in de programmabegroting

Geef hieronder aan wat de belangrijke wijzigingen zijn in de programmabegroting ten opzichte van de begroting van het gebiedsprogramma.

Geen wijzigingen. De Gebiedscoalitie heeft er wel voor gekozen om vanuit het procesgeld voor Groen Verbindt (gebiedsdeal 4) middelen in te zetten voor de bekostiging van de aanloop van Gebiedsdeal 5. Dit is gebeurd in de vorm van een voorschot en wordt vereffend uit een bijdrage die we gekregen hebben van de provincie Zuid-Holland.

De financiering van de totstandkoming van gebiedsdeal 5 uit budget van gebiedsdeal 4 is afgestemd met de provincie Zuid-Holland. Het argument van de gebiedscoalitie om gedurende de gebiedsdeal 4 te investeren in het nieuwe programma is dat de gebiedscoalitie het als haar taak ziet om gebiedsdeal 4 op te schalen en continuïteit te bieden voor het regionale netwerk.

De Gebiedscoalitie vindt het overigens ook haar taak om Groen Verbindt goed te begeleiden om zodoende continuïteit te bieden. Dit is hoe de landschapstafels bedoeld zijn.

Geef hieronder aan welk bedrag per project is gemoeid met de evt. nieuwe projecten (zoals hierboven bedoeld), die geen deel uitmaken van het oorspronkelijke programmabudget c.q. meerjarig gebiedsprogramma

In 2020 zijn geen nieuwe projecten toegevoegd. De laatste wijzigingen vindt u terug in de voortgangsrapportage 2019.

Informatie over vervallen of stagnerende projecten

Geef hieronder informatie over projecten of projectonderdelen die zijn komen te vervallen, of waar sprake is van stagnatie ten opzichte van de oorspronkelijke plannen en programma's. Benoem wat in de plaats is gekomen voor deze projecten en hoe de landschapstafel er voor zorgt, dat gestelde doelen en ambities alsnog gehaald worden. Geef ook aan wat de omvang is (in euro's) van deze vervallen of stagnerende projecten.

In 2020 zijn geen projecten vervallen. Ook zijn geen projecten gestagneerd. Er is, zoals eerder vermeld sprake van vertraging bij vier projecten. Maar dit leidt niet tot stagnatie.

Financiële omvang van eerder opgevoerde, maar inmiddels vervallen projecten

nvt

Financiële omvang van stagnerende projecten

nvt

Informatie over de projectfasen

Geef hieronder inzicht in welk deel van de projecten in voorbereiding is, welk deel in uitvoering is en welk deel is afgerond. Dit wordt uitgedrukt in de omvang van de begrote projectkosten in euro's. Peildatum is 31 december 2020. Hierbij worden de volgende definities gehanteerd:

Project in voorbereiding: Dit betreft projecten waarbij al kosten zijn gemaakt voor de ontwikkeling van het project(plan):

- Plan van aanpak (beschrijving van het proces)
- Projectplan/visie: Inhoudelijke beschrijving van het project
- Voorlopig Ontwerp (VO)
- Definitief Ontwerp (DO).

Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs.

Project in uitvoering: Het project wordt beschouwd als 'in uitvoering', in de fases van:

- Bestek
- Aanbesteding
- Uitvoering door aannemer.

Hier zijn aantoonbaar verplichtingen aangegaan (denk bijvoorbeeld aan contract met de aannemer/ leverancier).

Project afgerond: Een project wordt als afgerond beoordeeld, als de verplichtingen voor het project zijn nagekomen (de aannemer heeft werk opgeleverd, diensten of producten zijn geleverd). De betalingen aan de aannemer / leverancier hoeven nog niet te hebben plaatsgevonden.

Totale omvang van de provinciale subsidie voor hele periode 2016-2022	€ 1.500.000,-
Totale omvang van de provinciale subsidie voor projecten in voorbereiding	€ 0,-
Totale omvang van de provinciale subsidie voor projecten in uitvoering	€ 825.111,- + € 32.341,-
Totale omvang van de provinciale subsidie voor projecten die zijn afgerond	€ 524.709,- + € 117.659,-

Toelichting op het bovenstaande:

De Gebiedscoalitie ontvangt € 1.500.000,- aan provinciale bijdrage. € 150.000,- besteden wij aan 'het proces'. Dit betekent dat er netto € 1.350.000,- voor de projecten wordt ingezet. Zestien projecten zijn reeds afgerond. Het provinciale bedrag dat aan deze projecten is besteed, is € 524.709,-. Het resterende bedrag van € 825.111,- wordt besteed aan de overige 18 projecten. Dit telt op tot € 1.349.820,-. Het restant is afronding.

Van het procesbudget van € 150.000,- hebben wij € 117.659,- reeds besteed. Dit hebben we gekoppeld aan 'projecten afgerond'. De resterende € 32.341,- hebben we nog ter besteding. Dit bedrag hebben we gekoppeld aan 'projecten in uitvoering'.

Zie in de bijlage het totaaloverzicht van de projecten.

Netwerkontwikkeling

Geef hieronder een beschrijving van de wijze en kwaliteit van samenwerken tussen de deelnemende partijen aan de landschapstafel. Geef daarbij aan:

- op welke wijze de landschapstafel investeert in haar eigen netwerkontwikkeling
- hoe de overlegpartners in de regio zijn meegenomen die niet aan de landschapstafel zitten
- hoe de landschapstafel zich heeft ontwikkeld.

Aanbeveling: Om de kwaliteit van samenwerking te meten en daar een goed gesprek over te hebben aan de landschapstafel, wordt aanbevolen om gebruik te maken van de netwerkvitaliteitsmeter. Deze bestaat uit een enquête onder de deelnemers en aansluitend een gezamenlijk gesprek met een externe begeleider. De uitkomsten van deze 'meting' kunnen worden opgenomen in deze toelichting. Vanuit de provincie Zuid-Holland kan een facilitator worden geleverd om deze netwerkvitaliteitsmeting uit te voeren.

Netwerkend leren

Gebiedsdeal 4 Groen Verbindt

De kracht van onze landschapstafel, de Gebiedscoalitie A-V ligt in de ontmoeting, het netwerkend leren. In 2020 is dit ingewikkelder geweest. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten en het contact met projecteigenaren heeft uitsluitend via teams en mails plaatsgevonden.

De Gebiedscoalitie heeft in 2020 geen kartrekkersbijeenkomsten kunnen organiseren.

In 2018 hebben wij de netwerkvitaliteitsmeter ingezet en in 2019 een uitgebreid aantal sessies reflexieve monitoring. In 2020 hebben wij dit niet gedaan.

Het bestuur van de Gebiedscoalitie is vier maal (deels digitaal) bij elkaar gekomen.

Gebiedsdeal 5 Groenblauw Verbindt

Wel hebben wij in de periode september-oktober 2020 drie bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding op gebiedsdeal 5.



Foto 1: Netwerkbijeenkomst biodiversiteit en ondertekening beheerconvenant met vier nieuwe gemeenten (september 2020)

Foto 2: Verkenning van verhaallijnen 'water' tijdens Schetsschuit Water en Recreatie, (september 2020)

Communicatie en informatie

Op www.gebiedsdeal.nl staat een compleet naslagwerk met alle informatie en documentatie over alle projecten, de kartrekkersbijeenkomsten en andere relevante informatie over *Groen Verbindt*.

Informatie over behaalde resultaten op provinciaal doelniveau

Beschrijf hieronder per provinciaal doel (te weten: groenbeleving, biodiversiteit en agrarisch ondernemerschap) de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Dit kan bijvoorbeeld gaan over fysieke resultaten, geleverde diensten, communicatieve/educatieve resultaten of bijvoorbeeld het invoeren van innovatie in systemen of ketens. Per provinciaal doel kunnen de resultaten worden geclusterd naar de doelen en subthema's, zoals opgenomen in de beschikkingsbrief.

Resultaten groenbeleving / recreatie

Den Hâneker, Tenstoonstelling van het landschap

Stand van zaken project: In 2019 afgerond met tentoonstelling en een document. Financiële afronding volgt in 2021.

Stichting Groene hart, Funerair Erfgoed, Historische themaroute

Stand van zaken project: Project is afgerond met een lezing en wandeling op 31 maart 2020 en het toevoegen van de juiste borden op de route. Financiële afronding volgt in 2021.

Gemeente Alblasserdam, Lammetjeswiel

Stand van zaken project: reeds in 2018 afgerond met oplevering van de herinrichting. Financiële afronding heeft plaatsgevonden.

Gemeente Leerdam: Stadspark Leerdam

Stand van zaken project: Project is bijgesteld naar aanleiding van een bewonersavond en inspraak van de jachthaven. Uitvoering loopt nog. Vertraagd omdat de Omgevingsdienst Utrecht een te hoge eis stelde aan de sanering van de grond. Een aangepast bodemsaneringsplan is gemaakt waarvoor de vergunning is afgegeven. Verwacht afrondingsmoment: zomer 2021.

Gemeente Papendrecht: Slobbengors Papendrecht

Stand van zaken project: Project is in 2019 afgerond en financieel afgerond.

Wellantcollege, Beeldkwaliteit in het onderwijs

Project is in 2019 afgerond. Financiële afronding volgt in 2021. Een vervolg is opgenomen in 'Gebiedsdeal 5'.

Gemeente Sliedrecht, Sliedrecht buiten, aanleg watercompensatie

Stand van zaken project: Dit project is in de uitvoeringsfase. Het project had in 2020 enige vertraging door het uitblijven van een vergunning. Met dank aan de provincie Zuid-Holland is deze afgegeven. Aanbesteding is snel doorlopen.

Verwachte afronding 2021.


Blauwzaam, Waterwerkgroep, Blauwgroen fundament

Stand van zaken project: Project is afgerond met een aantal zichtbare resultaten die ontsloten zijn via de website van Blauwzaam.

1. Dit jaar is het gelukt om vanuit dit project een nieuw project te realiseren namelijk een drukdrainageproject met drie boeren : <https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/drukdrainage/>
2. We zijn een serie krantenartikelen gestart over klimaat: <https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/klimaatadaptatie-in-de-polder-artikelserie/>

3. Dit jaar het project klimaatbestendig groenbestek afgesloten:
<https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/klimaatbestendig-groenbestek/>
4. begeleiding student Bart van der Sande <https://www.blauwzaam.nl/bbb/verslag-bbb-klimaatverandering-23012020/>

Financiële afronding volgt in 2021. Follow up via Gebiedsdeal 5.

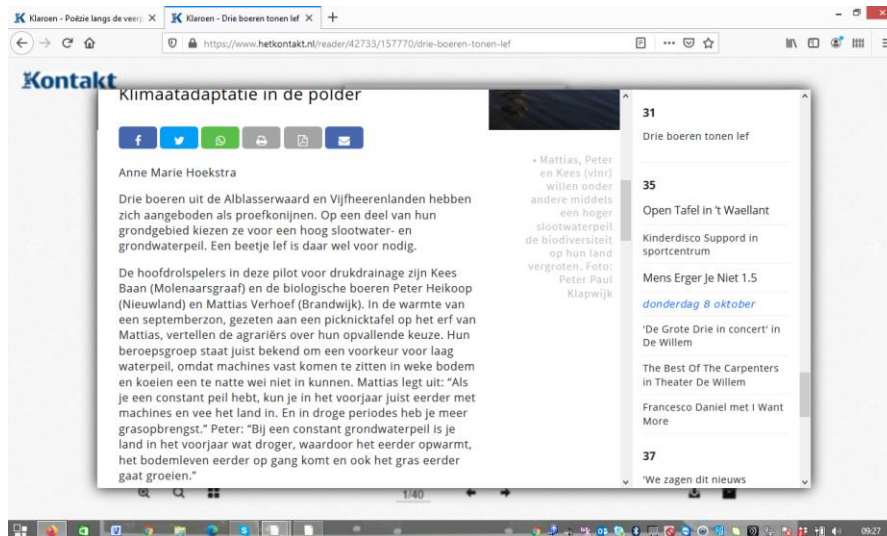

Stichting Lionsclub Alblasserwaard Souburgh, Dichter bij de polder

Stand van zaken project: Er zijn aan de lopende band gedichten onthuld. Deze zijn allemaal met een drone opgenomen en via youtube gedeeld. Het totaal aantal staat op 24 gedichten. De stichting blijft gedichten plaatsen, ook in 2021.

Voorbeeld: https://youtu.be/_uGwhq-qz_M

Stichting Lionsclub Alblasserwaard Souburgh, Dichter bij de rivier

Stand van zaken project: Zie 'Dichter bij de polder'

Gemeente Leerdam: TOP Leerdam

Stand van zaken project: Het realiseren van de TOP is overgedragen aan Citymarketing Leerdam Glasstad. De fysieke zaken zijn uitgevoerd. De teksten rond de panelen moeten nog worden gemaakt via Leerdam Glasstad. Oplevering zomer 2021.

Lexmond: Waterberging

Stand van zaken project: Afgerond in 2019. Geen subsidie, dus geen financiële afronding.

Gemeente Gorinchem: Historische haag langs vestingwal

Stand van zaken project: Afgerond met voltooiing van de meidoornhaag. Lokale media hebben aandacht besteed aan het resultaat. Financiële afronding volgt in 2021.

Gebiedscoöperatie Alblasserpoort: Opwaarderen overland 'de Kurk'

Stand van zaken project: Afgerond in 2020 met aanleggen wandelpad, informatiebord, gebiedseigen dotters en knotwilgen. Financiële afronding volgt in 2021.

Stichting Oud-Hollandse waterlinie: Waterliniepad 2.0

Stand van zaken project: Afgerond in 2020. Financiële afronding volgt in 2021.

Resultaten biodiversiteit

Gemeente Molenwaard, Entreezone Bleskensgraaf ('Dorpsgezichten')

Stand van zaken project: Project is afgerond met verfraaiing van het pad aan de Zeemansweg en een waterberging aan de Wervenkampseweg. Financiële afronding volgt in 2021.

Stichting Blauwzaam, Prachtlint

Stand van zaken project: Het uitbouwen van het prachtlint is verder een doorlopend proces waarbij parels worden toegevoegd en het beheerconvenant wordt uitgebreid (zie boven). Er is sprake van opschaling en uitbreiding richting Krimpenerwaard en Gebiedsdeal 5. Financiële afronding volgt in 2021.

Gemeente Meerkerk, Prachtlint

Stand van zaken project: Project is in uitvoering. Er is in 2019 gewerkt via NL doet. In 2020 is dit als gevolg van Corona niet doorgegaan. Project vordert wel, met hulp van de gemeente. Inzaaiing langs de Energieweg heeft plaatsgevonden, het bedrijventerrein ook. Afronding in 2021.

Collectief A-V/Blauwzaam: Schone natuurrijke sloten

Den Hâneker heeft een POP3 aanvraag gedaan voor de uitvoering van deze projecten. Deze POP 3 is niet gehonoreerd. De projecten zijn hiermee vervallen. De projecten Dotterslingers en Topsloten zijn door het Collectief A-V in samenwerking met Blauwzaam, via Groen Verbindt, alsnog gestart onder de titel 'Schone natuurrijke sloten'.

In 2020 is overleg gevoerd over de exacte locaties en zijn dotters gepland.

Artikel in Het Kontakt <https://www.hetkontakt.nl/reader/42881/155387/meer-kansen-voor-natuur-in-sloten>

Artikel in Nature tot day https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26595

In 2021 kan dit project worden afgerond.

Blauwzaam: Waarde van de waard. Verkenning circulaire initiatieven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Stand van zaken: Verkenning is in 2019 uitgevoerd. Financiële afronding heeft plaatsgevonden.

Gemeente Papendrecht: Verbeteren entrees Vriesenpolder

Stand van zaken: Het uitwerken en uitvoeren van deelprojecten die bijdragen aan het verbeteren van de entrees naar de Vriesenpolder, waarbij de barrière-werking van de Rijksweg A15 (en achterliggende infrabundel) wordt verminderd. De aansluitingen moeten plaatsvinden in "de zone langs de N3" en zijn ingepast in het ontwerp (en de fasering van de werkzaamheden) van Rijkswaterstaat op / langs de N3.

- Taludtrap N3: is in uitvoering
- Formaliseren "Olifantenpad". Projectonderdeel is afgerond
- Aanpassen belijning "Ius fietspad opgang Fietsbrug A15". Dit heeft iets vertraging omdat oorspronkelijk ontwerp verkeerskundig niet goed was.
- Taludtrap "Ius fietspad opgang Fietsbrug A15". Projectonderdeel is in uitvoering

De laatste werkzaamheden vinden in 2021 plaats.

Stijn Philips: Natuurfilm Alblasserwaard

Stand van zaken project: Ruwe eindversie van 50 minuten is klaar. Oplevering in 2021 om in de winter van 2020-2021 nog enige winteropnames te maken. Vertoning van de film is in verband met Corona op korte termijn onzeker.



OBS J.P. Waale: vergroening nieuw schoolplein Lingeplein

Stand van zaken project: Het groene schoolplein is aangelegd met VMBO leerlingen en MBO leerlingen die uitleg hebben gegeven over WADI (water afvoer en drainage). Het project wordt in 2021 financieel afgesloten en heeft spin off gehad met verbinding naar een tweede schoolplein. 10 scholen hebben interesse getoond voor deelname aan Gebiedsdeal 5.

Blauwzaam: Zwammen kweken op reststroom

Stand van zaken project: Het project is vertraagd als gevolg van Corona. Wellant heeft de kweekactiviteiten kunnen voortzetten maar de Avonturenboerderij is veelal gesloten geweest en heeft de financiering tijdelijk stopgezet. Als Corona achter de rug is en de boerderij weer open kan, wordt het project voortgezet.

Blauwzaam: Verkenning, Verbouwen van bouwmaterialen

Stand van zaken verkenning: Het project vordert gestaag met een bijeenkomst bij Blauwzaam, goed contact met architecten. Knelpunt is dat Corona het enthousiasme bij grotere bedrijven heeft doen verkleinen. Hoop op versnelling als dit voorbij is.



Deelprogramma Biodiversiteit Waterdriehoek – gebiedscoalitie

Versterking biodiversiteit en duurzame landbouw
Waterdriehoek, regio A-V

1. Westeinde
2. Rustgebied Reewild
3. Noordrand A15
4. N3 zone
5. Baanhoekweg



Gebiedscoöperatie Alblasserpoort, Westeinde, Wijngaarden (particulier initiatief, binnen de gemeente Molenwaard)

Stand van zaken: Project is vertraagd. De gemeente Molenlanden heeft erg veel tijd nodig om de onderbouwing voor het wijzigen van het bestemmingsplan te beoordelen.

De vergunning van het Waterschap Rivierenland is in 2020 afgegeven om het water te maken.



Verder is gestart met het rooien van bosschages nadat hier vergunning voor was afgegeven.

Natuur- en vogelwacht: Rustgebied reewild en educatieterrein

Stand van zaken: Project is in 2019 afgerond. Financiële afronding volgt in 2021.

Gemeente Dordrecht en gemeente Papendrecht, in samenwerking met Rijkswaterstaat, herinrichting N3

Stand van zaken:

De uitvoering is in 2020 gestart. Het project verloopt volgens planning en is in het derde kwartaal van 2021 afgerond. Een deel is klaar zoals de natuurvriendelijke oever langs N3. Een deel is gepland of wordt uitgevoerd. Denk aan 'oversteekgebieden voor dieren'.

Noordrand A15 (gemeente Papendrecht)

Stand van zaken: De Ontwikkeling Noordrand A15 heeft een samenhang met de deelprojecten op / langs het talud van de N3 en de (recreatieve) aansluitingen op de Vriesenpolder.

De gemeente heeft, in samenwerking van met een landschapsarchitect, een visiekaart "Ontwikkeling Park A15" opgesteld. Deze visiekaart is het handvat bij de uitwerking van projecten in de N3 en A15-zone. Hiermee is de integrale ontwerpvisie gewaarborgd bij de uitwerking van de "losse deelprojecten" en aangrenzende "uitwerkingsopgaven". Vanuit de visiekaart zijn in 2020 werkzaamheden gerealiseerd, zoals de aanleg van de NVO bij het Molenpad, het aanbrengen van bijenmengsels in de groenstrook langs de geluidsschermen en een aansluiting op de wijk Vriesenpolder.

In Q2-2021 worden de resterende werkzaamheden afgerond. Deze bestaan uit de aanleg van een voetpad door het projectgebied, het plaatsen van een bijenhotel, de aanleg van een keverbank en wordt een zitbank aangebracht.

Gemeente Dordrecht: Verbeteren ecologische functie Baanhoekweg

Stand van zaken: Project is gedeeltelijk afgerond, maar zal niet geheel worden afgerond. In overleg met de gemeente hebben we besloten het project financieel af te ronden. Er is wel voldaan aan de financiële voorwaarden.

Verkenningen

Verkenning biodiversiteit

De verkenning biodiversiteit is in 2019 uitgevoerd en afgerond. Voor deze verkenning is geen subsidie ingezet.

Resultaten agrarisch ondernemerschap

Zuivelfabriek Graafstroom, Kaas Experience center

Stand van zaken project: Het project is vertraagd en gewijzigd als gevolg van te hoge uitvoeringskosten.

De vergunningen waar in 2019 op gewacht werd, zijn in 2020 afgegeven.

Het plan achter het project kaasexperience is in 2020 herontworpen en in afgeslankte vorm opnieuw aanbesteed. Dit is gelukt. De planonderdelen die gecontinueerd worden, zijn het herstel van het gebouw, de herbestemming van de boerderij en het passend maken in de omgeving, inclusief groene entree. De nieuwbouw is duurzaam en er is sprake van informatie en educatie in het gebouw. Dit betekent dat de doelstellingen voor de subsidie Groen Verbindt gehaald worden. Het project wordt mede gefinancierd door andere subsidies waarvan de doelen niet allemaal gehaald worden. Met de overige subsidiegevers hebben we overleg en afgesproken dat de uitvoering integraal wordt gevolgd.

Den Hâneker, Agrarische bedrijven in het groen

Stand van zaken project: POP3 aanvraag is gedaan en in 2018 gehonoreerd. Dit betekent dat de uitvoering formeel buiten *Groen Verbindt* valt. Wel hebben Den Hâneker en de Gebiedscoalitie besloten dat de

uitvoering in de context van *Groen Verbindt* wordt uitgevoerd. Het project heeft enige vertraging als gevolg van Corona.

Boerderij en erf, Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Stand van zaken project: Dit project vordert langzaam. De gemeente Molenlanden heeft inmiddels een beleidsnota vastgesteld. Deze moet overgenomen worden door de gemeente Vijfheerenlanden. Dan kan dit project worden afgemaakt.

Boerderij en Erf en het Gebiedsplatform schatten in dat ook in 2022 nog uitvoering plaatsvindt.

Wellantcollege, Verkenning Duurzame landbouw

Stand van zaken: In 2019 hebben een aantal goede activiteiten plaatsgevonden. De verkenning is opmaat geweest voor het onderdeel Veen in beweging, een van de drie geprioriteerde thema's in gebiedsdeal 5. Uit de verkenning is het idee ontwikkeld waarbij Wellantcollege, locatie Bossekamp als duurzame landbouwhub in de regio gaat fungeren. In 2021 wordt de verkenning formeel afgerond.

Bestedingen op provinciaal doelniveau

	<i>T.I.v. provinciale subsidie</i>	<i>T.I.v. andere financiers (= cofinanciering)</i>
Bestedingen afgelopen jaar aan het doel recreatie	€ 16.000,-	€ 50.975,-
Bestedingen afgelopen jaar aan het doel biodiversiteit	€ 104.840,-	€ 232.000,-
Bestedingen afgelopen jaar aan het doel duurzame landbouw	€ 0,-	nvt
TOTAAL	€ 120.840,-	€ 282.975

De hierboven genoemde bestedingen zijn voorschotten die in 2020 door vijf projecten zijn aangevraagd. De overige projecten kiezen ervoor om hun bijdrage eenmalig, bij afronding van het project, te ontvangen. Er zijn in 2020 zeven projecten in behandeling genomen voor de financiële afrekening. Dit wordt in 2021 afgerond. Deze zijn niet in het overzicht meegenomen.

Kosten programmamanagement ("proceskosten")

Geef hieronder inzicht in de omvang van gemaakte kosten in euro's voor programmamanagement, voor zover deze ten laste komen van de provinciale subsidie. Vermeld ook voor welke activiteiten / werkzaamheden deze kosten zijn gemaakt.

Beschikbaar budget voor proceskosten: € 150.000,- (10%).
Cumulatieve uitgaven tot en met 31-12-2020: € 117.659

Programmamanagement: € 107.024,-

- Projectleiding Groen Verbindt en deelproject biodiversiteit met waterdriehoek
- Voorzitterschap Gebiedscoalitie

-Vrijwilligersvergoeding bestuur Gebiedscoalitie

Communicatie en bijeenkomsten: € 1.235,-

Advies en training: € 9.400,-

Het regiobureau A-V brengt geen kosten voor penvoerderschap, administratie en control in rekening. De verwachte accountantskosten (ca. € 7.000) maken deel uit van de proceskosten.

OVERZICHT PROJECTEN EN PENVOERDISVOERBENKOSTEN GROEN VERBODT		20-2-2021							
ONDERDEEL € 1.200.000 MEERJARENPROGRAMMA									
Projecten in Groen Verbondt (jan. 2016) (44)		Startdatum project	Oranje: project in uitvoering groen: project is afgerond						
naam project	uitvoerder	penvoerde is overeenkomst	bijdrage uit Gr. Verbondt	totale projectkosten	% Gr. Verb.	artrekkler	mailadres		
Aankleding dorpegezicht	Gem. Molenlanden, Klankbordgroep Bleskensgraaf	07-02-2018 ondertekend	€ 20.000	€ 40.000	50 %	Peter Verwoert Henri Ouwertrek	peter.verwoert@jouwgemaa.nl henri.ouwertrek@jouwgemaa.nl		
Bee diwallatie AV in het oude wijk	Wielantcollege	20-03-2018 ondertekend; 21-02-2018 ondertekend;	€ 27.500	€ 55.000	50 %	Ton Schuller	tschuller@welant.nl		
Blaasgoud: Ruimtelijke Werkgroep 1) 3)	St. Blaasgoud	18-07-2019 verbeterde versie ondertekend	€ 118.100	€ 236.207	50 %	Rolie Wiggelinkhuizen	rolie@hs.koppert.nl		
Historische themamontes 3)	St. Godehart	18-12-2017 ondertekend	€ 30.000	€ 61.855	48,5 %	Joke Kramer	kramer.groenehart@gmail.com		
Kaaspeletoe 2)	Zilverbleek De Gaastroom	20-02-2018 ondertekend	€ 237.500	€ 2.503.396	8 %	Jan Boeke	j.boeke@hetnet.nl		
Lammesjeweel	Gem. Alblaslandam	05-07-2017 ondertekend	€ 100.000	€ 400.000	25 %	Marco van den Boschert Kees Okker	m.van.den.boschert@alblaslandam.nl k.okker@alblaslandam.nl		
Praaktint Meentek	Gem. Vijfheerenlanden	27-03-2018 ondertekend	€ 6.250	€ 23.150	27 %	Annie Schuurmans	a.schuurmans@vijfheerenlanden.nl		
Schubbe	Gem. Papendrecht	13-04-2018 ondertekend	€ 5.289,30	€ 21.157,20	25 %	Daniëlle Wijnen	d.wijnen@papendrecht.nl		
Stadspark Leendam	Gem. Vijfheerenlanden	14-02-2018 ondertekend	€ 40.000	€ 215.000	18,6 %	Dick Admiraal	d.admiraal@vijfheerenlanden.nl		
Tentoonstelling Landschap 1)	De Helleker	19-03-2018 ondertekend; 08-07-2019 verbeterde versie ondertekend	€ 25.000	€ 64.475	38,8 %	Dick de Jong	d.jdejong@planet.nl		
Versterking Praaktint (Praaktint 2.0) 1) 3)	St. Blaasgoud	07-02-2018 ondertekend; 19-06-2019 verbeterde versie ondertekend	€ 90.000	€ 180.000	50 %	Richard Slagboom	r.slagboom@kpnmail.nl		
Vreespolder	Gem. Papendrecht	26-03-2019 ondertekend	€ 10.000	€ 40.000	25 %	Daniëlle Wijnen	d.wijnen@papendrecht.nl		
			€ 709.639	€ 4.240.240					
Eerste tranche reserveprojecten (mrt. 2018) (46)									
naam project	uitvoerder	penvoerde is overeenkomst	bijdrage uit Gr. Verbondt	totale projectkosten	% Gr. Verb.	artrekkler	mailadres		
Dichterbij de polder	St. Loois Abtbasenwaard Sorbtig	10-08-2018 ondertekend	€ 10.000	€ 29.325	34,1 %	Roel Teeuwen	roel.teeuwen@planet.nl		
TD P Leendam	Gem. Vijfheerenlanden	17-10-2018 ondertekend	€ 5.135	€ 20.135	25,5 %	Dick Admiraal	d.admiraal@vijfheerenlanden.nl		
Vrijkomende agrarische bebouwing	St. Bodegraven	10-09-2018 ondertekend	€ 13.000	€ 52.000	25 %	Dick de Jong	d.jdejong@planet.nl		
			€ 28.135	€ 101.460					
Tweede tranche reserveprojecten (mrt. 2019) (47)									
naam project	uitvoerder	penvoerde is overeenkomst	bijdrage uit Gr. Verbondt	totale projectkosten	% Gr. Verb.	artrekkler	mailadres		
Dichterbij de rivier	St. Loois Abtbasenwaard Sorbtig	09-07-2019 ondertekend	€ 10.794	€ 31.690	34 %	Roel Teeuwen	roel.teeuwen@planet.nl		
Nette doorderingsschone, natuurlijke boe rensloten	Gebiedscollectief / Blaauwzaam	09-11-2019 ondertekend	€ 48.469	€ 98.469	49 %	Martel Benschop	marte@collectief-av.nl		
Natuurfilmbioscoop	Stijn Philips	28-05-2019 ondertekend	€ 9.500	€ 19.000	50 %	Stijn Philips	stijnphilipsnatuurfilms@gmail.com		
Opwaardernooierland "De Alblasenkurk"	Gebiedscoöperatie "De Alblasenpoort"	01-09-2019 ondertekend	€ 14.000	€ 28.000	50 %	Tony Tessen	tony.tessen@jouwgemaa.nl		
Sleedrecht Buitende weterberging	Gem. Sledrecht	18-11-2019 ondertekend	€ 45.000	€ 95.000	8 %	Edwin Versluis	e.versluis@slidrecht.nl		
Waterliniepadi 2.0	St. Oude Hollandse Waterliniepadi	10-06-2019 ondertekend	€ 18.500	€ 39.750	47,7 %	Bert Fels	bermfels@ezigo.nl		
Zwammenkwelen op reststromen	St. Blaauwzaam	12-07-2019 ondertekend	€ 50.160	€ 139.580	36 %	Gerard de Winter	gerard@konkama.nl		
			€ 196.413	€ 920.499					
Derde tranche reserveprojecten (zomer 2019) (48)									
naam project	uitvoerder	penvoerde is overeenkomst	bijdrage uit Gr. Verbondt	totale projectkosten	% Gr. Verb.	artrekkler	mailadres		
Historische haagland Gorinchem vestingwal	Gem. Gorinchem	27-08-2019 ondertekend	€ 7.500	€ 15.750	47,6 %	Jorick de Kreij	j.d.kreij@gorinchem.nl		
Groenschoolplein Gorinchem	J.P. Waasveld	12-11-2019 ondertekend	€ 14.000	€ 28.000	50 %	Hellen Blom	d.jette.jouwale@stichtingav.nl		

Bijlage voortgangsverslag - Projectenoverzicht landschapstafels OVER DE GEHELE PROGRAMMAPERIODE

In dit overzicht hebben we de totale bedragen opgenomen. We verwijzen naar het bijgevoegde exceloverzicht waarin we met de kleuren 'Oranje' en 'groen' aangeven welke project in uitvoering zijn (Oranje) en welke zijn afgerond (groen). De projecten waarvoor wij een stelpost BTW van € 50.000 hebben opgenomen, hebben we meegenomen in het overzicht. Dit bedrag is nog niet betaald en is dan ook opgenomen in de eerste tabel met projecten in uitvoering.

Projecten in UITVOERING

#	Naam project	Coördinaat of adres	Datum start uitvoering project	Datum project afgerond	Trekkende partij project	Totaalbedrag project €	Subsidiebijdrage PZH €	Bijdrage derden €
	18 projecten		Ondertekening penvoerdersovereenkomst			€ 4.231.096,-	€ 825.111,-	€ 3.405.985,-
			Proceskosten				€ 32.341,-	
Totaal:						€ 4.231.096,-	€ 857.452,-	€ 2.305.985,-

Projecten die zijn AFGEROND

#	Naam project	Coördinaat of adres	Datum start uitvoering project	Datum project afgerond	Trekkende partij project	Totaalbedrag project €	Subsidiebijdrage PZH €	Bijdrage derden €
	16 projecten		Ondertekening penvoerdersovereenkomst	2018/2019		€ 1.222.266,20	€ 524.889,-	€ 696.757,20
			Proceskosten				€ 117.659,-	
Totaal:						€ 1.222.266,20	€ 643.368,-	€ 696.757,20

Projecten NIET in uitvoering op 31 december 2019 (wel in voorbereiding)

#	Naam project	Coördinaat of adres	Datum start voorbereiding project (indien van toepassing)	Beoogde einddatum (indien van toepassing)	Trekkende partij project	Totaalbedrag project €	Subsidiebijdrage PZH € (indien van toepassing)	Bijdrage derden € (indien van toepassing)
	nvt							

Totaal:	€	€	€
