Procesplanning: Raadzaal Papendrecht (variant E)

Papendrecht

Datum: 08-09-2025
Versie: 1
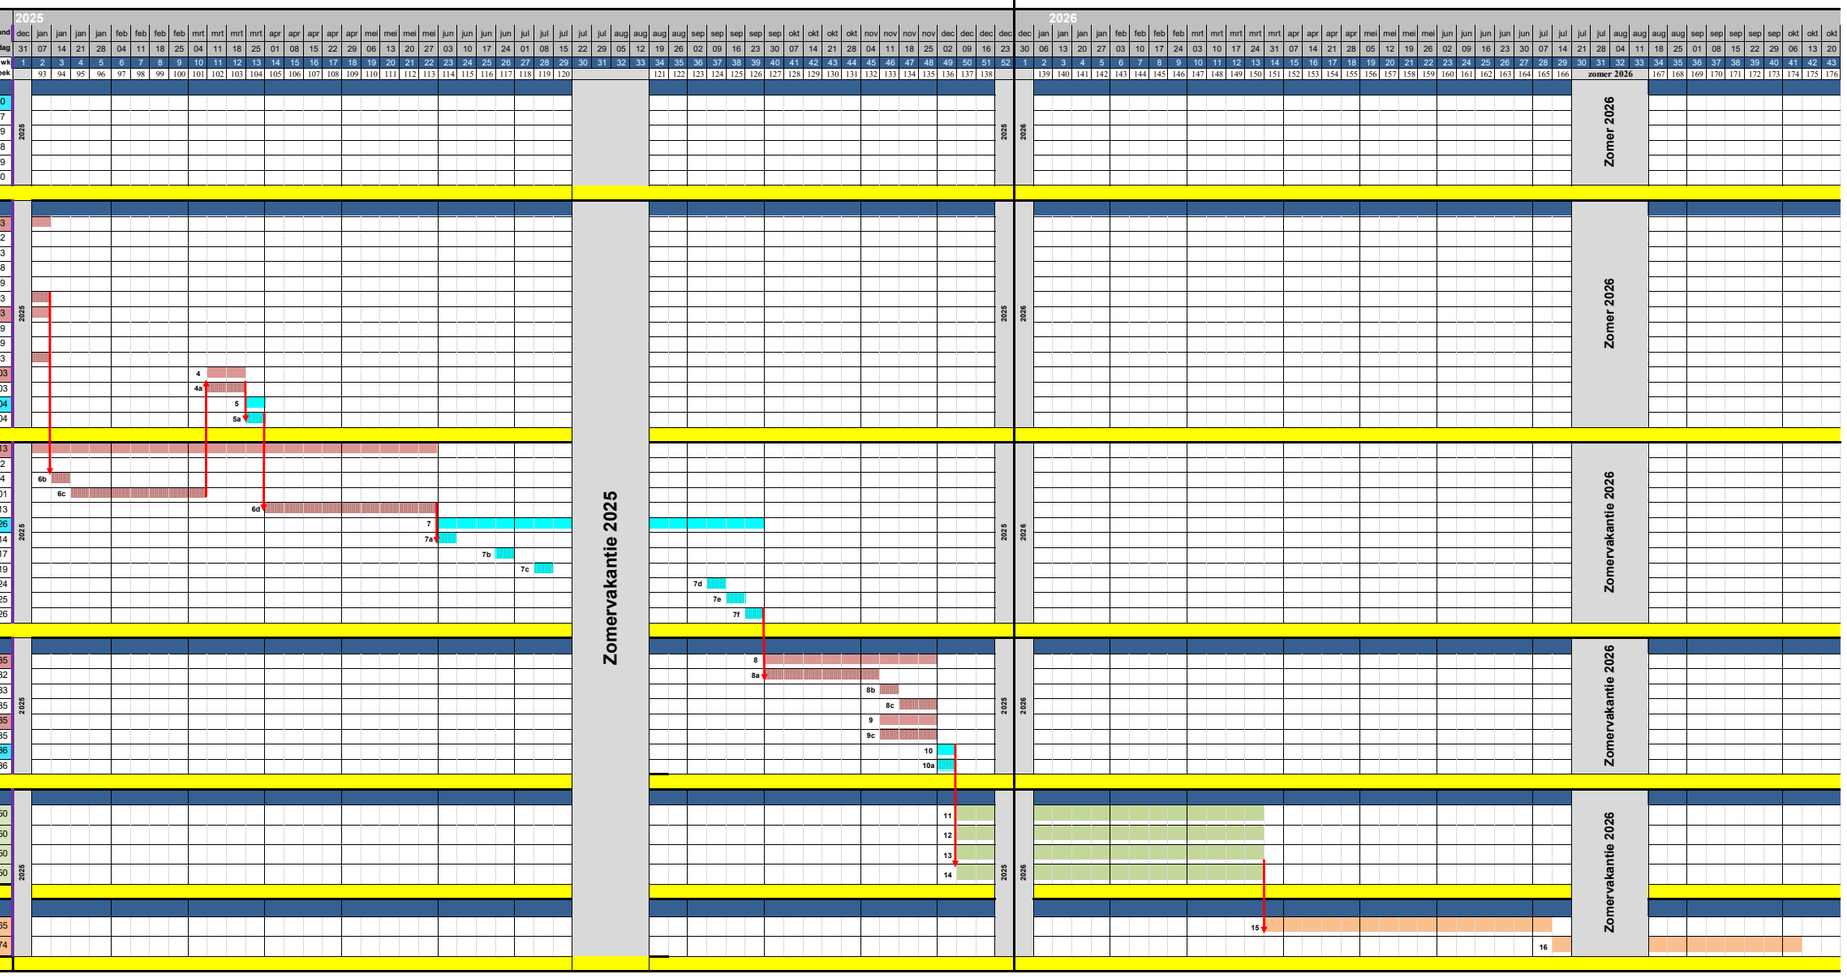
	Nr.	Omschrijving	Actie door	Duur	kalender wk	planweek
Definitie		**Definitiefase**				
	01	Vaststellen uitgangspunten en proces			77	80
	1a	*Specificaties vaststellen*	MS / GP	00 wk	77	77
	1a	*Gesprekken wensen griffie*	GP	01 wk	78	79
	1d	*Procesplanning opstellen*	GP	01 wk	77	78
	1e	*Afstemmen procesplanning*	GP	01 wk	78	79
	1f	*Definitief uitgangspunten en proces*	GP	00 wk	80	80
Definitief Ontwerp		**Definitief Ontwerp / indeling Raadzaal**				
	02	Definitief Ontwerp van Es interieur		13 wk	80	93
	2a	*Beoordelen opties van Es interieur*	Gemeente	03 wk	80	82
	2b	*Gesprek van Es interieur*	Gemeente / van Es architecten	01 wk	83	83
	2c	*Ontwerp raadzaal (variant E) , Kooij en Ooosteind (concept)*	van Es architecten	05 wk	84	88
	2d	*Afstemming (27-11-2024)*	Gemeente / van Es architecten	01 wk	89	89
	2f	*Afronden Definitief Ontwerp (D.O.) raadszaal, Kooi en Oosteind*	van Es architecten	04 wk	90	93
	03	Constructieve aanpassing Definitief Ontwerp		06 wk	87	93
	3a	*Verstrekken archiefstukken aan constructeur*	Gemeente	03 wk	87	89
	3b	*Afspraak op locatie met constructeur (20-11-2024)*	Concretio Ingenieurs / gemeente	01 wk	89	89
	3c	*Onderzoeksrapport steunbalk uitwerken*	Concretio Ingenieurs	04 wk	90	93
	04	Kostenraming		01 wk	102	103
	4a	*Opzetten kostenraming*	Kostendeskundige	02 wk	102	103
	05	Definitief Ontwerp gereed			104	104
	5a	*Definitief Ontwerp en kostenraming gereed*	Team	01 wk	104	104
Goedkeuring	06	Afstemming Lokale Driehoek		31 wk	82	113
	6a	*Vaststellen Proces en Projectopdracht*	Driehoek	01 wk	82	82
	6b	*Presentatie ontwerp van Es architecten + memo stavaza opdracht (14-01-2025)*	van es architecten / Driehoek	01 wk	94	94
	6c	*Beoordelen ontwerp en keuzes uit memo*	Driehoek	07 wk	95	101
	6d	*Temporiseren*	Driehoek	09 wk	105	113
	07	Raadsbesluit Investering Raadszaal			114	126
	7a	*Overleg Driehoek*		01 wk	114	114
	7b	*Indienen eBesluitvorming*	GP / MS	01 wk	117	117
	7c	*College*	GP / MS	01 wk	119	119
	7d	*Beeldvorming - Commisie (11-09-2025)*	GP / MS	01 wk	124	124
	7e	*Besluitvorming - Commisie (15-09-2025)*	GP / MS	01 wk	125	125
	7f	*Besluitvorming - Raad (25-09-2025)*	GP / MS	01 wk	126	126
Uitwerking		**Werktekeningen / indeling Raadzaal**				
	08	Werktekeningen bouwkundig		08 wk	127	135
	8a	*Werktekeningen / indeling Raadzaal*	Tekenbureau	06 wk	127	132
	8b	*Afstemming werktekeningen*	Tekenbureau / van Es architecten	01 wk	133	133
	8c	*Definitief Werktekeningen / indeling Raadzaal*	Tekenbureau	02 wk	134	135
	09	Constructieve aanpassing t.b.v. Omgevingsvergunning		02 wk	133	135
	9c	*Tekening en berekening steunbalk definitief t.b.v. Omgevingsvergunning*	Constructeur	03 wk	133	135
	10	Uitwerking - gereed			136	136
	10a	*Definitief Ontwerp (architect / constructeur / begroting) gereed*	Team	01 wk	136	136
Inkoop		**Voorbereiding**				
	11	Omgevingsvergunning steunbalk (8 + 6 weken)	OZHZ	14 wk	137	150
	12	Inkoop aannemer steunbalk	Inkoop	14 wk	137	150
	13	Inkoop vloeren wanden en plafonds	Inkoop	14 wk	137	150
	14	Inkoop meubilair	Inkoop	14 wk	137	150
Uitv.		**Uitvoering**				
	15	Aanpassing constructie	Aannemer	14 wk	151	165
	16	Inrichting raadszaal	Interieurbouwer	08 wk	166	174
