Procesplanning: Raadzaal Papendrecht (variant F)

Papendrecht

Datum: 08-09-2025
Versie: 7
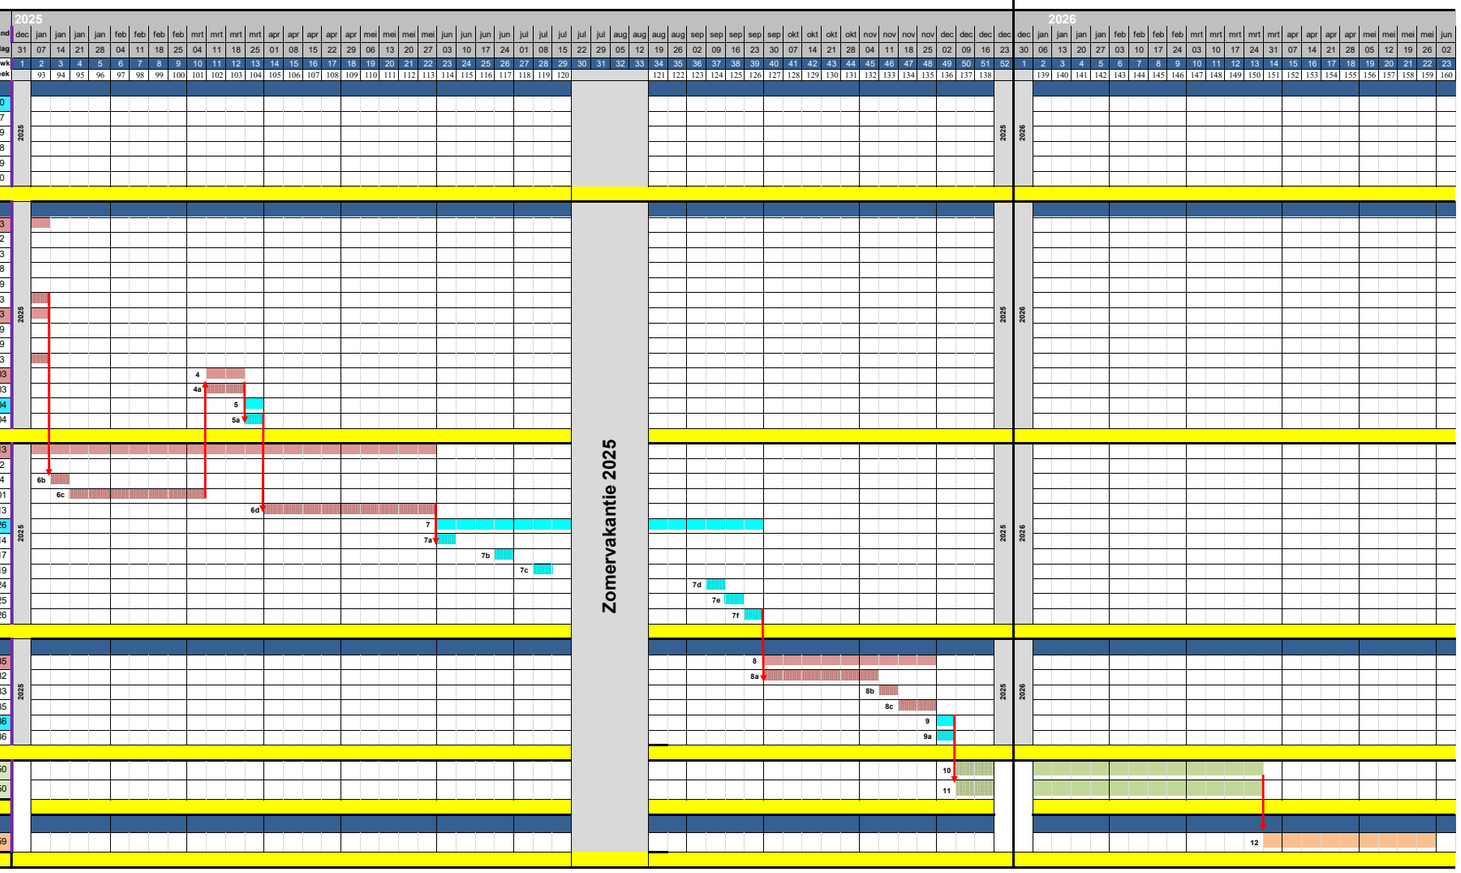
	Nr.	Omschrijving	Actie door	Duur	kalender wk	planweek
Definitie		**Definitiefase**				
	01	Vaststellen uitgangspunten en proces			77	80
	1a	*Specificaties vaststellen*	MS / GP	00 wk	77	77
	1a	*Gesprekken wensen griffie*	GP	01 wk	78	79
	1d	*Procesplanning opstellen*	GP	01 wk	77	78
	1e	*Afstemmen procesplanning*	GP	01 wk	78	79
	1f	*Definitief uitgangspunten en proces*	GP	00 wk	80	80
Definitief Ontwerp		**Definitief Ontwerp / indeling Raadzaal**				
	02	Definitief Ontwerp van Es interieur		13 wk	80	93
	2a	*Beoordelen opties van Es interieur*	Gemeente	03 wk	80	82
	2b	*Gesprek van Es interieur*	Gemeente / van Es architecten	01 wk	83	83
	2c	*Ontwerp raadzaal (variant E) , Kooij en Oosteind (concept)*	van Es architecten	05 wk	84	88
	2d	*Afstemming (27-11-2024)*	Gemeente / van Es architecten	01 wk	89	89
	2f	*Afronden Definitief Ontwerp (D.O.) raadszaal, Kooi en Oosteind*	van Es architecten	04 wk	90	93
	03	Constructieve aanpassing Definitief Ontwerp		06 wk	87	93
	3a	*Verstrekken archiefstukken aan constructeur*	Gemeente	03 wk	87	89
	3b	*Afspraak op locatie met constructeur (20-11-2024)*	Concretio Ingenieurs / gemeente	01 wk	89	89
	3c	*Onderzoeksrapport steunbalk uitwerken*	Concretio Ingenieurs	04 wk	90	93
	04	Kostenraming		01 wk	102	103
	4a	*Opzetten kostenraming*	Kostendeskundige	02 wk	102	103
	05	Definitief Ontwerp gereed			104	104
	5a	*Definitief Ontwerp en kostenraming gereed*	Team	01 wk	104	104
Goedkeuring	06	Afstemming Lokale Driehoek		31 wk	82	113
	6a	*Vaststellen Proces en Projectopdracht*	Driehoek	01 wk	82	82
	6b	*Presentatie ontwerp van Es architecten + memo stavaza opdracht (14-01-2025)*	van es architecten / Driehoek	01 wk	94	94
	6c	*Beoordelen ontwerp en keuzes uit memo*	Driehoek	07 wk	95	101
	6d	*Temporiseren*	Driehoek	09 wk	105	113
	07	Raadsbesluit Investering Raadszaal			114	126
	7a	*Overleg Driehoek*		01 wk	114	114
	7b	*Indienen eBesluitvorming*	GP / MS	01 wk	117	117
	7c	*College*	GP / MS	01 wk	119	119
	7d	*Beeldvorming - Commisie (11-09-2025)*	GP / MS	01 wk	124	124
	7e	*Besluitvorming - Commisie (15-09-2025)*	GP / MS	01 wk	125	125
	7f	*Besluitvorming - Raad (25-09-2025)*	GP / MS	01 wk	126	126
Uitwerking		**Werktekeningen / indeling Raadzaal**				
	08	Werktekeningen bouwkundig		08 wk	127	135
	8a	*Werktekeningen / indeling Raadzaal*	Tekenbureau	06 wk	127	132
	8b	*Afstemming werktekeningen*	Tekenbureau / van Es architecten	01 wk	133	133
	8c	*Definitief Werktekeningen / indeling Raadzaal*	Tekenbureau	02 wk	134	135
	09	Uitwerking - gereed			136	136
	9a	*Definitief Ontwerp (architect / begroting) gereed*	Team	01 wk	136	136
	10	Inkoop vloeren wanden en plafonds	Inkoop	14 wk	137	150
	11	Inkoop meubilair	Inkoop	14 wk	137	150
Uitv		**Uitvoering**				
	12	Inrichting raadszaal	Interieurbouwer	08 wk	151	159
