


Project: Raadszaal Papendrecht
Onderdeel: Kostenindicatie / begroting variant F (met kolom)
Datum: 8-9-2025

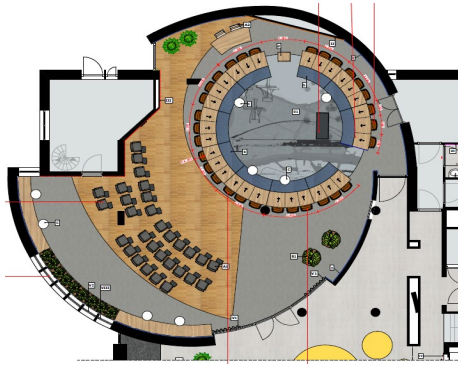

n.o.:	Partij:	Onderdeel:	kosten:
Voorlopig Ontwerp (V.O.)			€ 67.700
1	Van Es interieur	Voorlopig Ontwerp (V.O.)raadszaal	€ 16.800
2	Concretio ingenieurs	Memo analyse constructie	€ 2.200
3	Multical	Bouwkostenbegroting Voorlopig Ontwerp (V.O.)	€ 2.350
4	Projectmanagement	Procesbegeleiding Voorlopig Ontwerp (V.O.)	€ 46.350
Definitief Ontwerp (D.O.)			€ 36.884
6	Van Es interieur	Definitief Ontwerp (D.O.)	€ 19.200
8	Multical	Bouwkostenbegroting Definitief Ontwerp (D.O.)	€ 4.500
9	Projectmanagement	Procesbegeleiding Definitief Ontwerp (D.O.)	€ 13.184
Inkoop			€ 4.944
10	Projectmanagement	Procesbegeleiding Inkoop	€ 4.944
Uitvoering			€ 31.920
11	Van Es interieur	Esthetische bouwbegeleiding realisatie	€ 7.200
12	Projectmanagement	Procesbegeleiding realisatie	€ 24.720
Subtotaal voorbereidingskrediet			€ 141.448
Onvoorzien 10%			€ 14.145
Totaal voorbereidingskrediet			€ 155.593
n.o.:	Partij:	Onderdeel:	totaal:
100	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant F - Installaties	€ 11.069
101	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant F - Plafond	€ 26.602
102	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant F - Wandafwerking	€ 15.470
103	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant F - Vloerafwerking	€ 12.323
104	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant F - Vitrage entreepui	€ 2.229
105	Meubelleverancier	Raadszaal variant F - Nieuwe raadsopstelling	€ 98.856
106	Meubelleverancier	Raadszaal variant F - Wandbankelement gevel	€ 15.764
107	Meubelleverancier	Raadszaal variant F – Katheder	€ 3.000
108	Meubelleverancier	Raadszaal variant F – Bezoekersstoelen	€ 14.125
109	Specialist	Raadszaal variant F – Switchfoil op pui	€ 6.332
110	ICT leverancier	Raadszaal variant F – Spreekconsoles bedraad	€ 63.511
Totaal kostenraming			€ 269.280
Onvoorzien 15%			€ 40.392
Totaal kosten incl. onvoorzien			€ 309.671
Totaal voorbereidingskrediet			€ 155.593
Totaal kosten incl. onvoorzien			€ 309.671
Totaal variant F Raadszaal			€ 465.264
